

「事業計画行程表」(様式C-3)の主な修正事例

- ① 当初から年度内に完了しない計画になっている場合
- ② 複数の研究活動の一つにまとめている場合
- ③ 説明の内容が冗長な場合
- ④ 変更後、理由無く研究活動の期間が延長されている場合(1)
- ⑤ 変更後、理由無く研究活動の期間が延長されている場合(2)
- ⑥ 変更後、理由無く研究活動の進行を変更している場合
- ⑦ 中断期間が実線となっている場合
- ⑧ 研究成果の取りまとめの時期が修正されていない場合
- ⑨ 中断期間は研究実績が無いこととなっている場合
- ⑩ 年度当初に研究実績が無いこととなっている場合

修正が必要な点

①「研究活動A」が、当初から年度内に完了しない計画になっている。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動B → | | | | | | | | | | | |

修正点

①当初の「研究活動A」を年度内に完了する予定に修正する。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動B → | | | | | | | | | | | |

修正が必要な点

② 「研究活動A」及び「研究活動B」を1本の線でまとめている。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


修正点

② 「研究活動A」及び「研究活動B」を区分する。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


修正が必要な点

④ 「研究活動B」の変更後の研究期間が、3ヶ月延長されている。

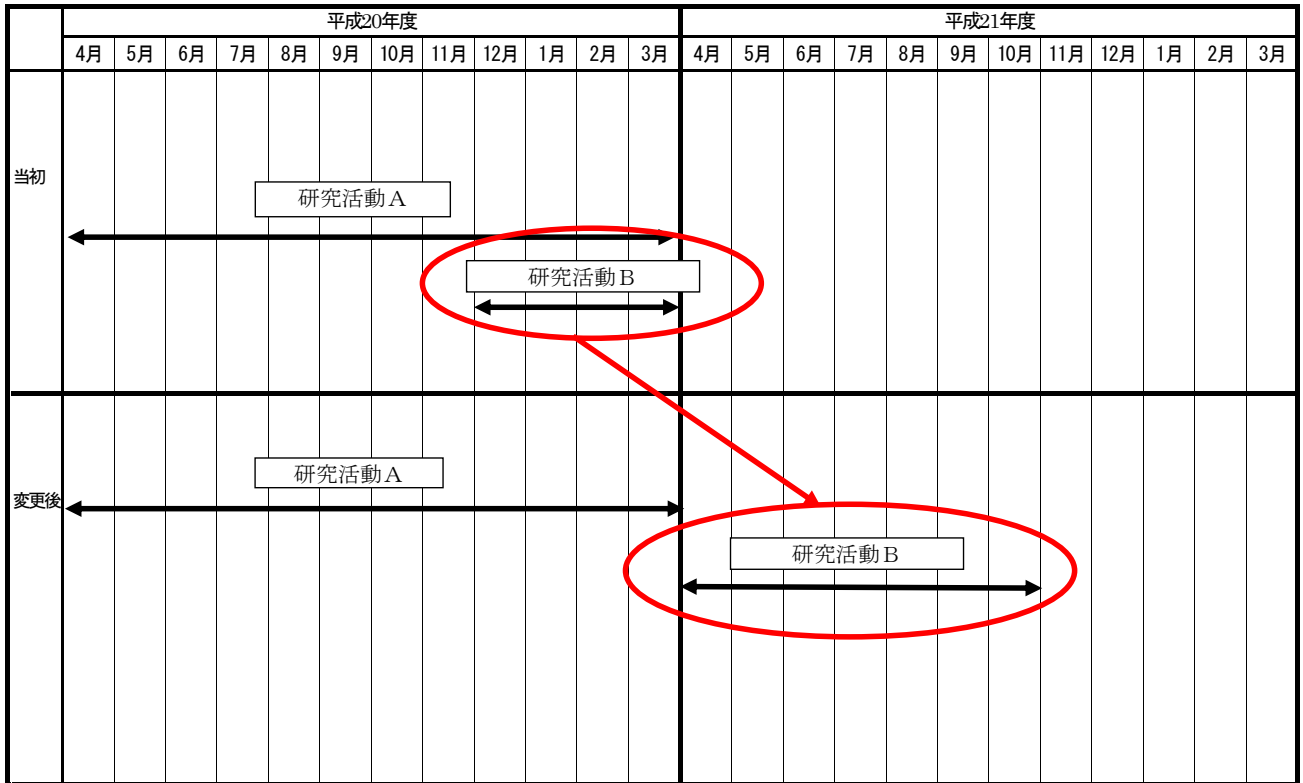


修正点

④ 「研究活動B」の研究期間を当初計画の4ヶ月に修正するか、又は、延長が必要となる理由を様式C-2に追記する。(修正後の図は、当初の計画に修正した例)

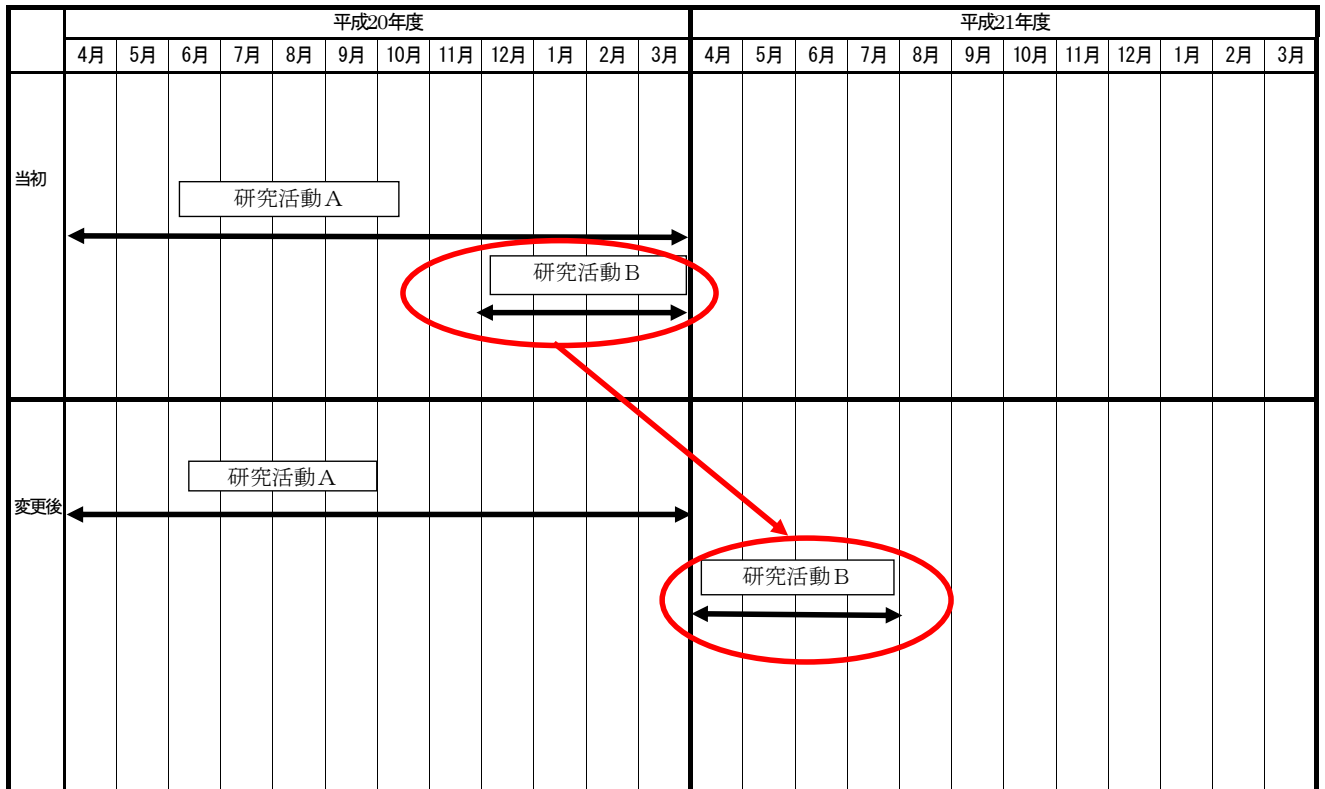


修正が必要な点

⑤ 「研究活動A」の変更後の研究期間が、2ヶ月延長されている。

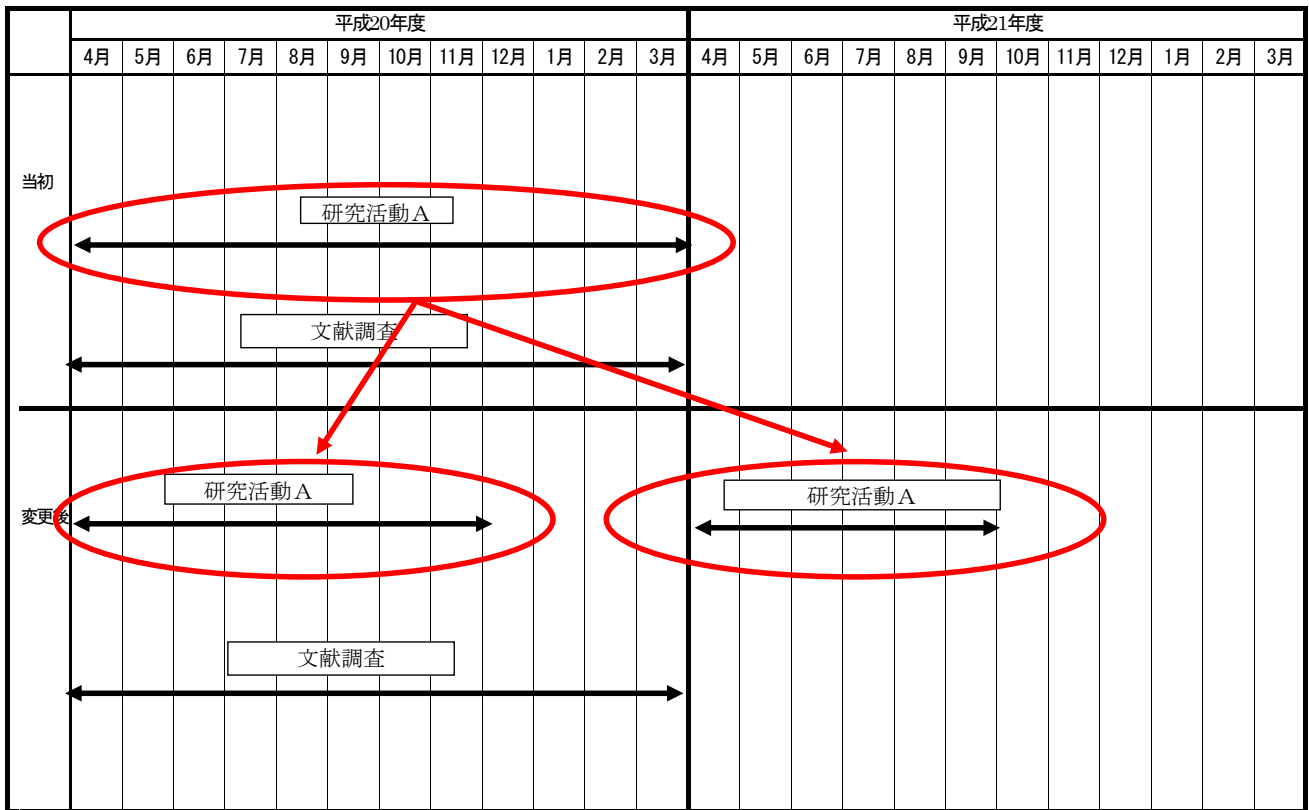


修正点

⑤ 「研究活動A」の研究期間を当初計画の12ヶ月に修正するか、又は、延長が必要となる理由を様式C-2に追記する。(修正後の図は、当初の計画に修正した例)

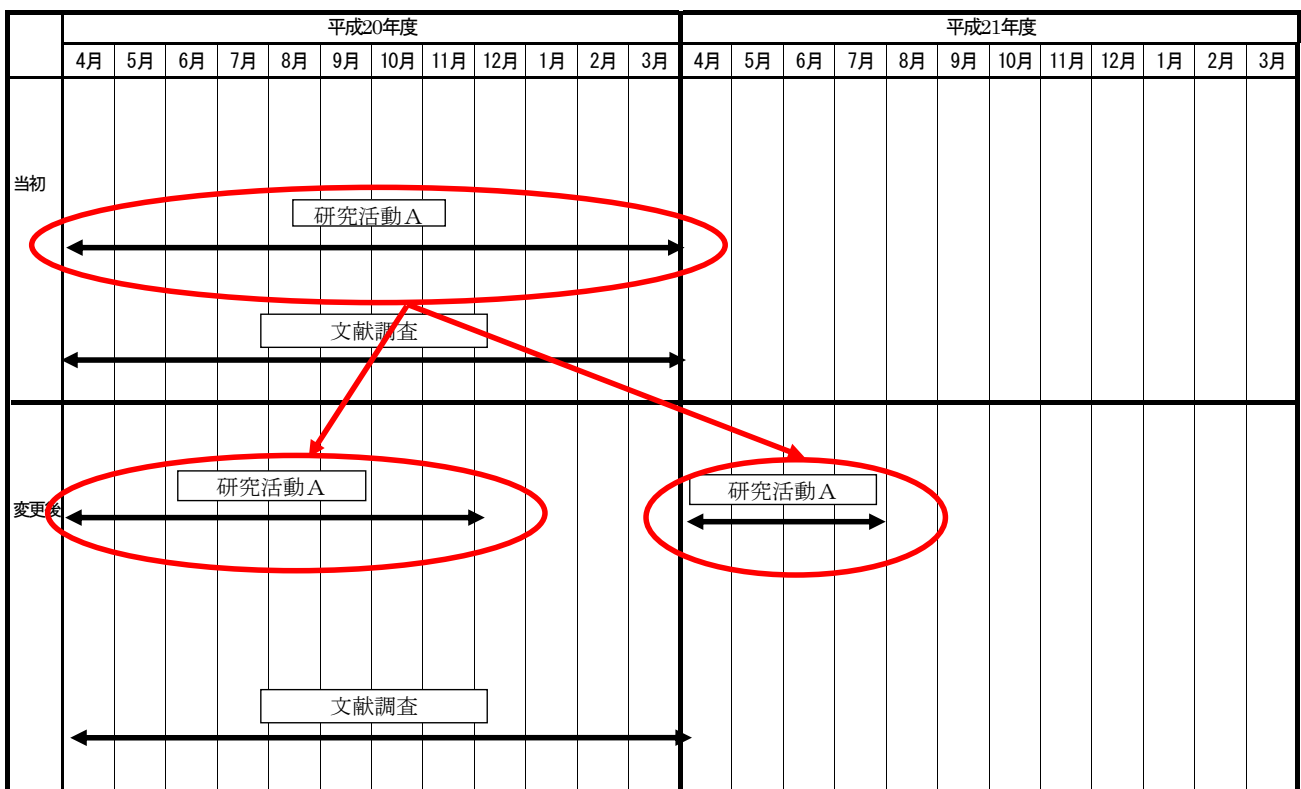


修正が必要な点

⑥ 当初の計画では、「研究活動B」は、「研究活動A」と同時に実施する予定が、変更後は同時進行となっていない。

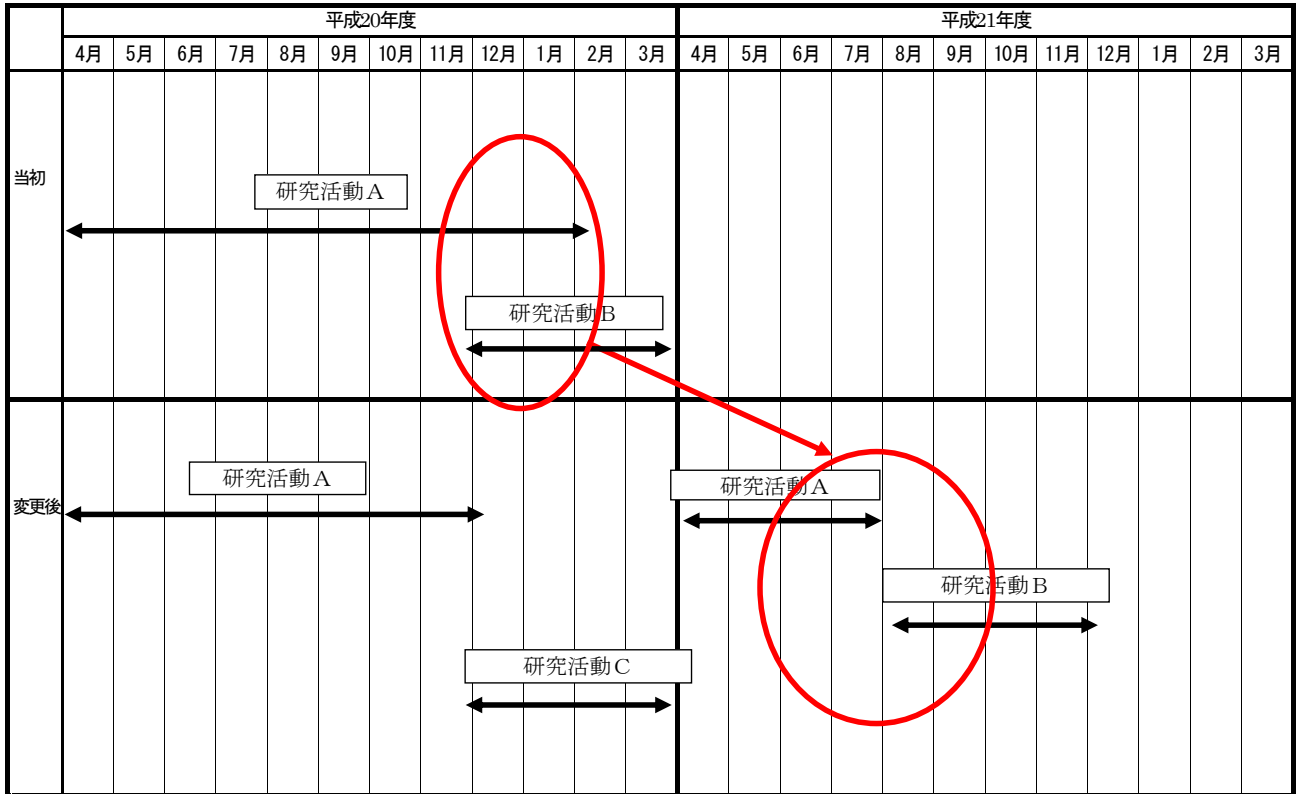


修正点

⑥ 当初の計画通りに修正する。

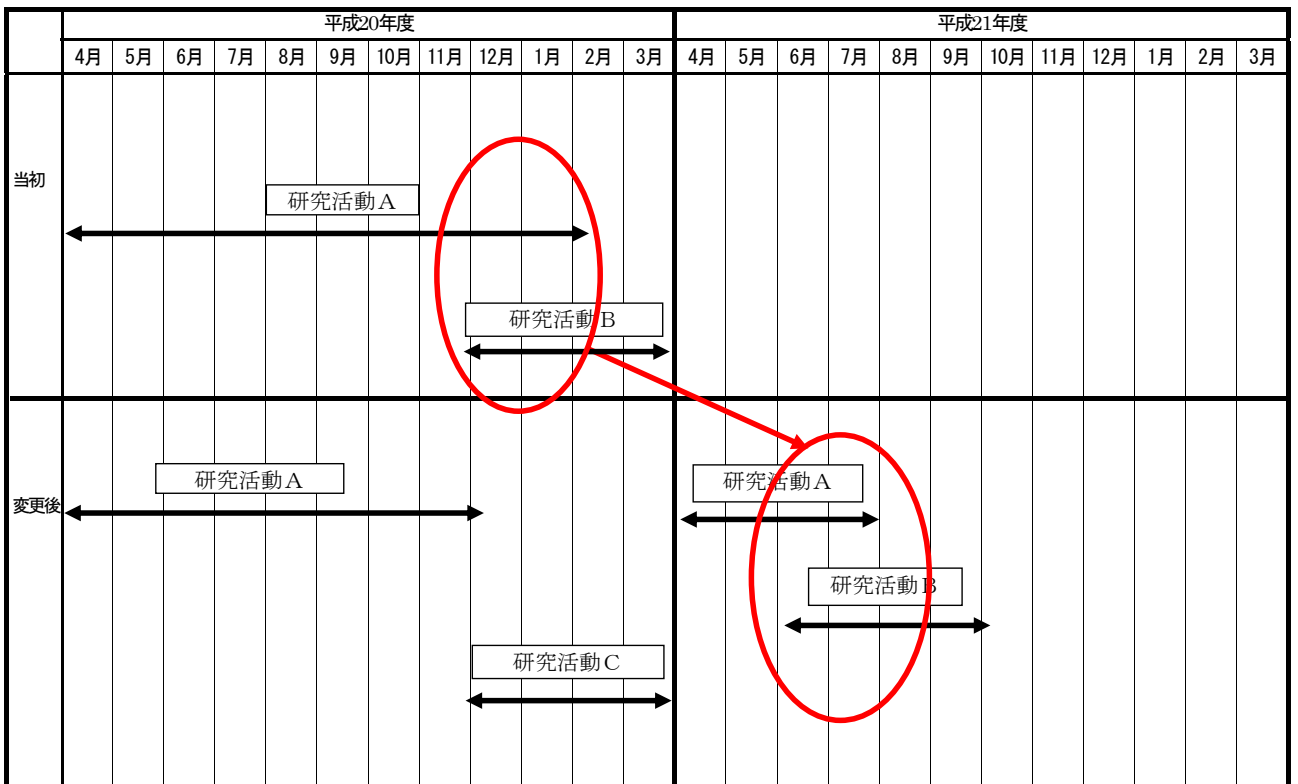


修正が必要な点

- ⑧ 当初の計画は、「研究活動A」及び「研究活動B」の結果を踏まえ、「研究成果のまとめ」を実施する予定が、変更後の計画では、「研究活動A」のみで「研究成果のとりまとめ」を実施することとなっている。

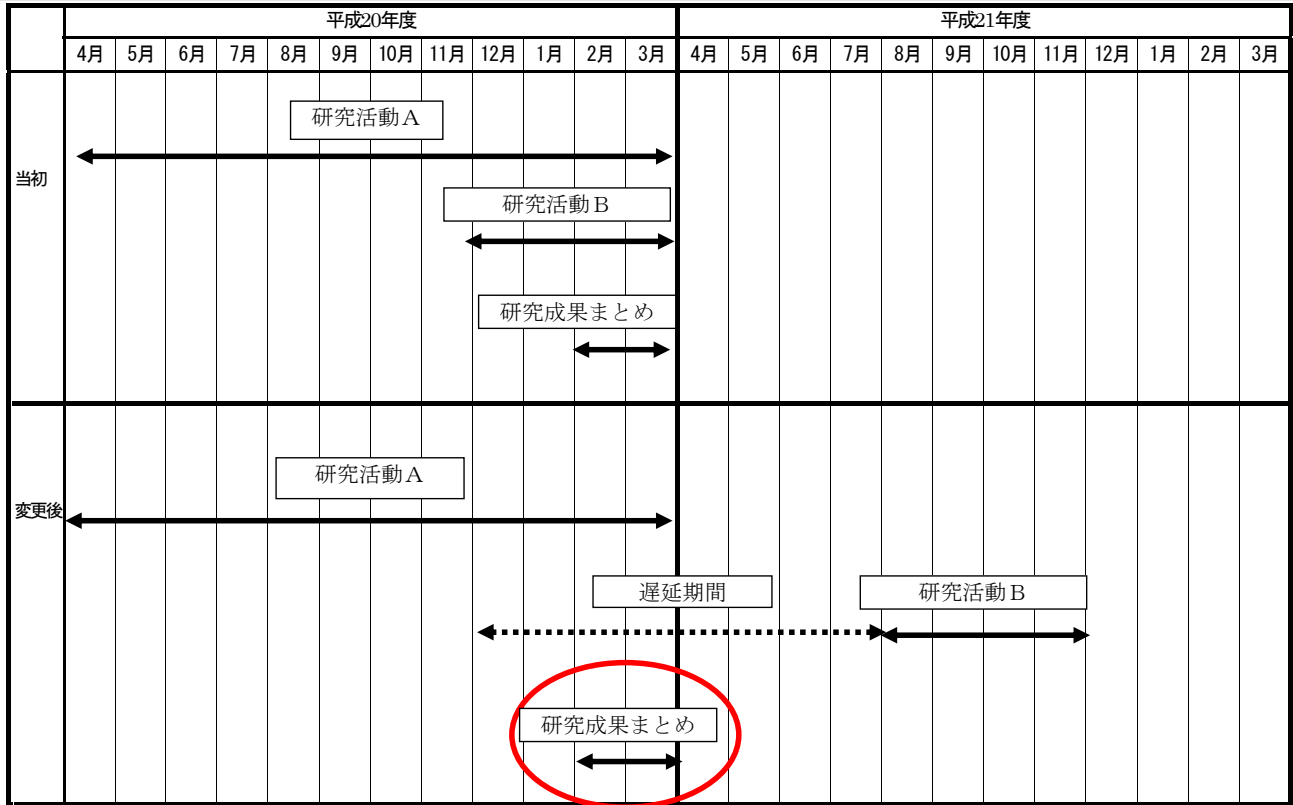

修正点

- ⑧ 当初の計画通りに修正する。

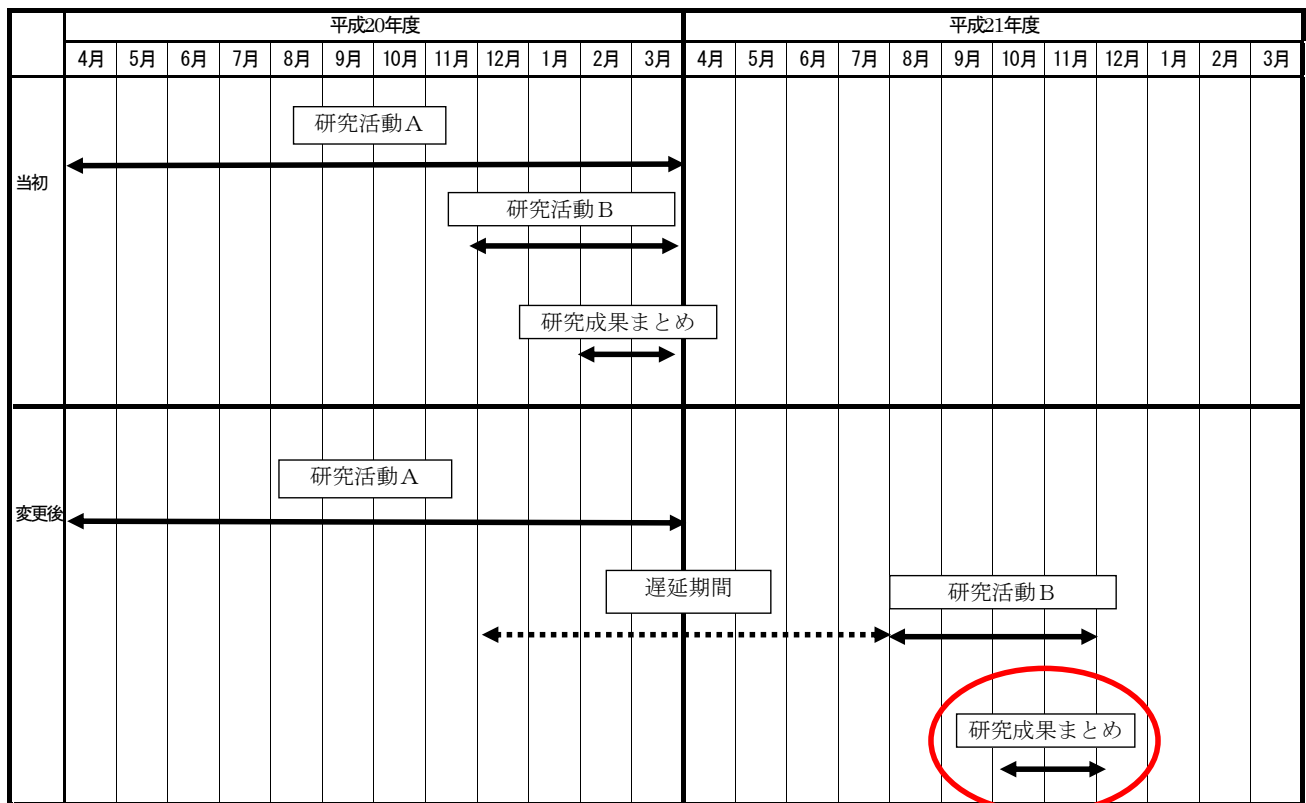

修正が必要な点

⑨ 変更後の研究計画では中断期間には活動実績が無いこととなっている。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動B → | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 遅延期間 → | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動B → | | | | | | | | | | | |

修正点

⑨ 中断期間に実施した研究活動Cの実績を、当初及び変更後の欄に追記する。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動B → | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動C → | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | ← 研究活動A → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 遅延期間 → | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動B → | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ← 研究活動C → | | | | | | | | | | | |

修正が必要な点

⑩ 研究活動の開始時期が（特別の理由無く）7月からとなっている。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

修正点

⑩ 研究活動の開始時期を4月からに修正する。（図は、継続課題の場合）

※ 交付内定が4月中旬の新規課題の場合は、内定通知の受領直後が開始時期となる。

| | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
