就学事務システム（学齢簿編製等）の標準化を推進するための調査研究　スケジュール

予定期間：　進捗率：　開始実績日：▲　終了実績日：▼　現在日：　日曜：　土曜：　祝日：　ターゲット日：

作成日：令和２年12月9日
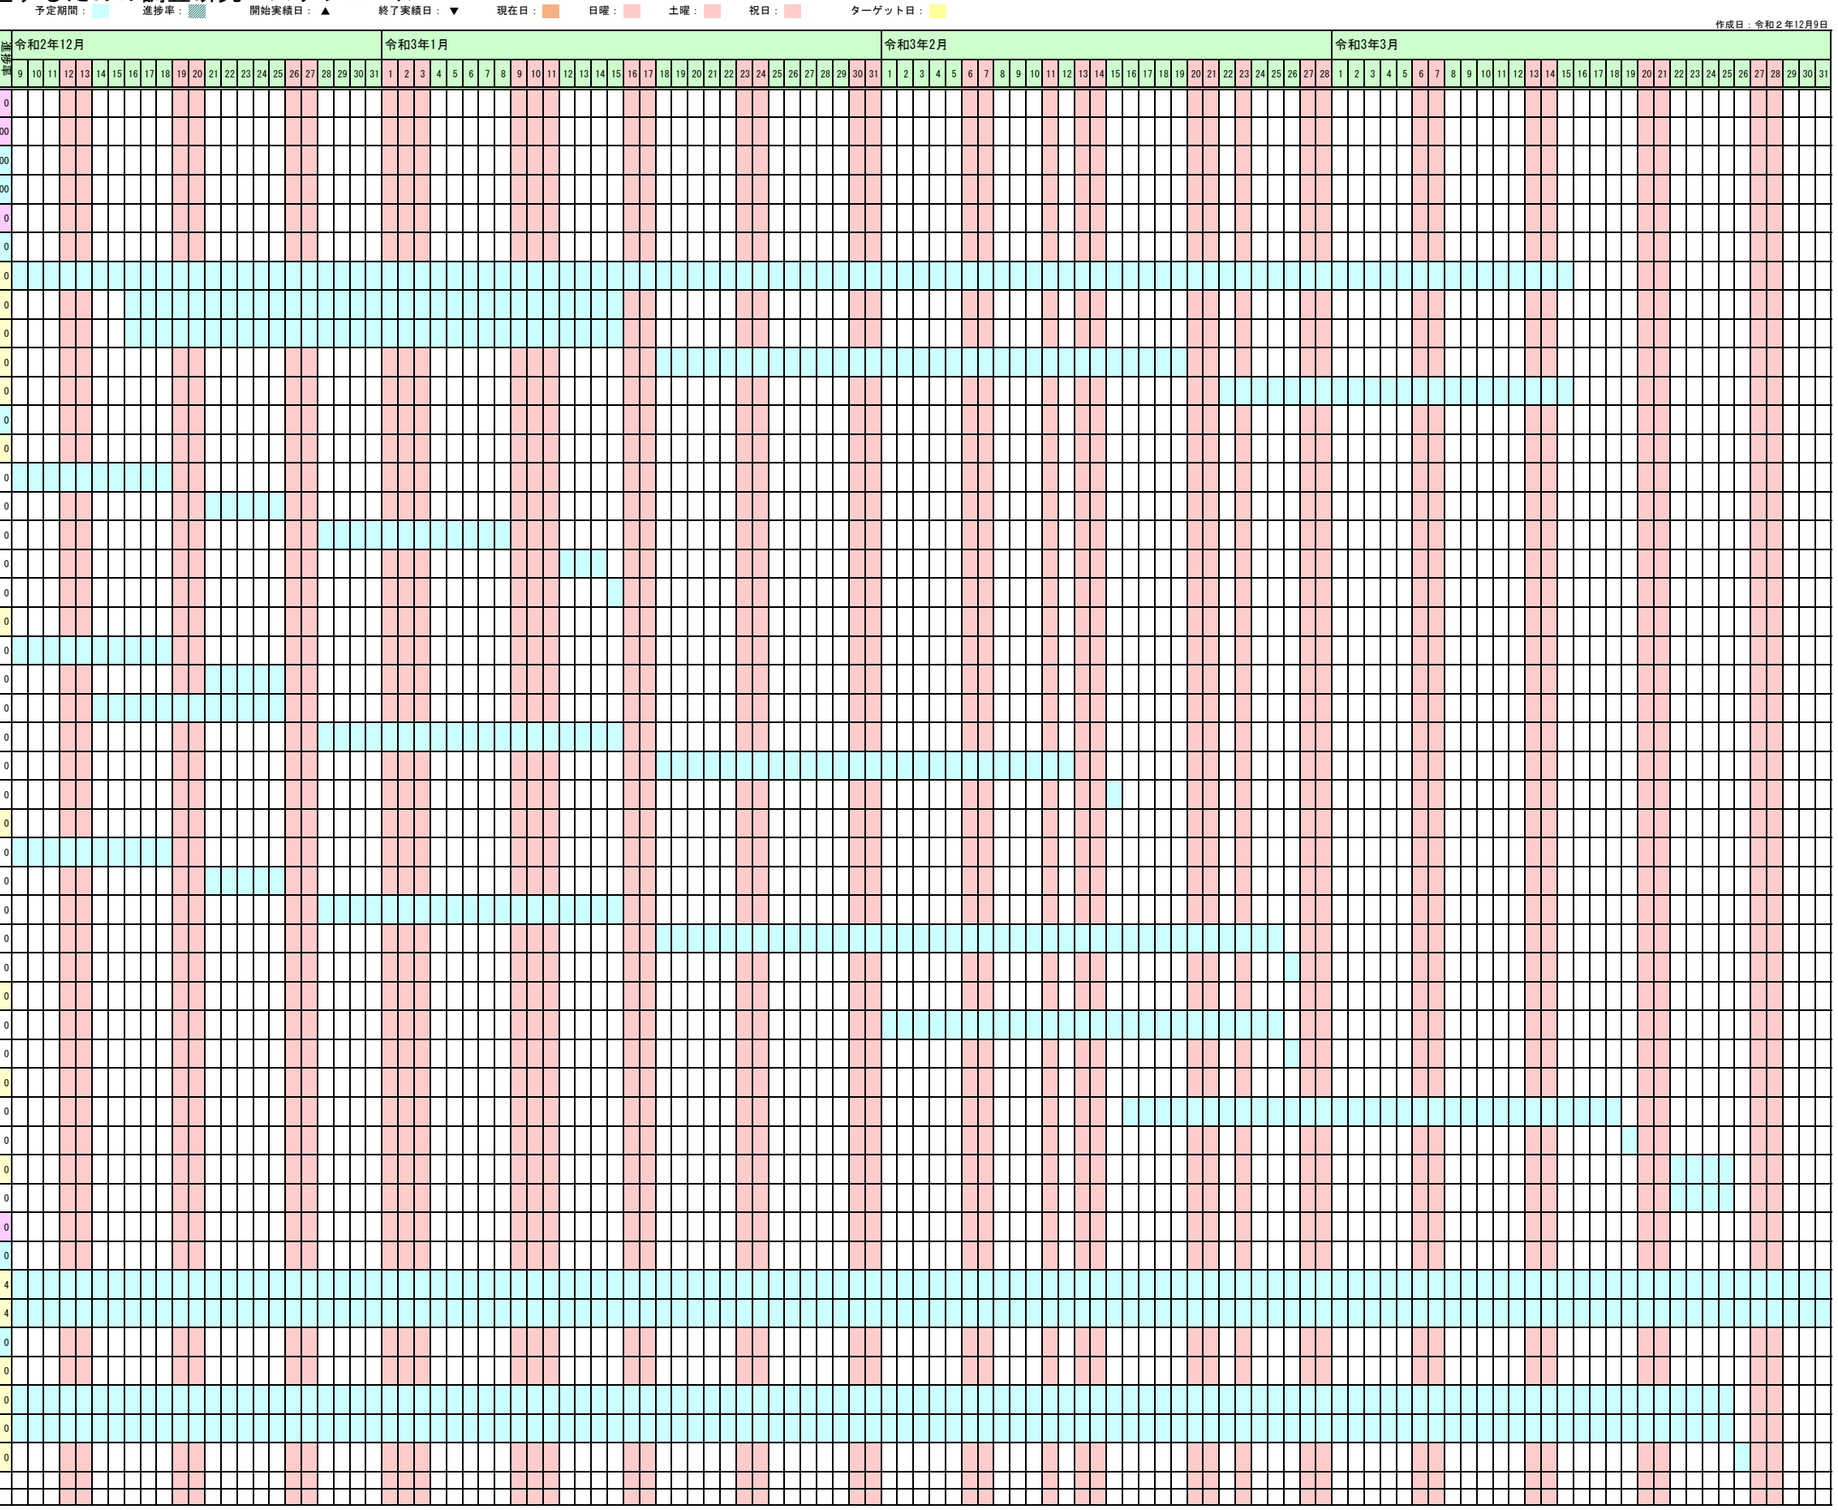
No	作業内容	開始予定日	終了予定日	開始実績日	終了実績日	進捗率(%)
1	学齢簿標準仕様書（案）作成					0
2	【１．プロジェクト計画】					100
3	プロジェクト計画書作成	R2.12.04	R2.12.07	R2.12.04	R2.12.07	100
4	キックオフ	R2.12.08	R2.12.08	R2.12.08	R2.12.08	100
5	【２．設計】					0
6	１．就学事務システム（学齢簿編製等）の標準化を図るための検討					0
7	システム標準化・共有化についての検討	R2.12.09	R3.03.15			0
8	職員の業務負担軽減の検討	R2.12.16	R3.01.15			0
9	システム構築・維持費等の削減の検討	R2.12.16	R3.01.15			0
10	自治体調達時のカスタマイズ抑制の検討	R3.01.18	R3.02.19			0
11	標準仕様書記載項目・内容の検討	R3.02.22	R3.03.15			0
12	２．標準仕様書（案）の作成					0
13	①　標準的な機能要件の整理					0
14	自治体向けヒアリングシートの作成	R2.12.09	R2.12.18			0
15	自治体ヒアリング実施（５自治体程度）	R2.12.21	R2.12.25			0
16	ヒアリング結果の分析	R2.12.28	R3.01.08			0
17	仕様書ひな型による対比表作成	R3.01.12	R3.01.14			0
18	★対比表レビュー	R3.01.15	R3.01.15			0
19	②　標準的な様式・帳票の作成					0
20	自治体向けヒアリングシートの作成	R2.12.09	R2.12.18			0
21	自治体ヒアリング実施（５自治体程度）	R2.12.21	R2.12.25			0
22	ベンダ標準レイアウト収集	R2.12.14	R2.12.25			0
23	ヒアリング結果の分析	R2.12.28	R3.01.15			0
24	就学事務システム（学齢簿編製等）の様式・帳票の作成	R3.01.18	R3.02.12			0
25	★標準帳票レイアウト等レビュー	R3.02.15	R3.02.15			0
26	③　学齢簿編製等に関する標準的な業務プロセスのフローチャート					0
27	自治体向けヒアリングシートの作成	R2.12.09	R2.12.18			0
28	自治体ヒアリング実施（５自治体程度）	R2.12.21	R2.12.25			0
29	ヒアリング結果の分析	R2.12.28	R3.01.15			0
30	業務プロセスのフローチャート等作成	R3.01.18	R3.02.25			0
31	★標準業務プロセスフローチャート等レビュー	R3.02.26	R3.02.26			0
32	④　用語					0
33	用語集の作成	R3.02.01	R3.02.25			0
34	★用語集等レビュー	R3.02.26	R3.02.26			0
35	⑤　標準仕様書（案）の作成					0
36	標準仕様書作成	R3.02.16	R3.03.18			0
37	★標準仕様書レビュー	R3.03.19	R3.03.19			0
38	⑥　その他	R3.03.22	R3.03.25			0
39	納品物作成、納品	R3.03.22	R3.03.25			0
40	【３．プロジェクト管理】					0
41	１．進捗管理					0
42	①　進捗管理	R2.12.04	R3.03.31	R2.12.04		4
43	②　ISO9001内部監査	R2.12.04	R3.03.31	R2.12.04		4
44	２．進捗報告等（会議体）					0
45	①　キックオフ	R2.12.08	R2.12.08			0
46	②　有識者会議	R2.12.09	R3.03.25			0
47	③　定例会／定例報告	R2.12.09	R3.03.25			0
48	④　最終報告会	R3.03.26	R3.03.26			0
49						
50
